Documentation Technique — Test Fluke

Contexte

Un test Fluke (ou test de câblage) consiste à vérifier qu'un câble réseau est correctement câblé et fonctionnel, en utilisant un testeur professionnel comme le **Fluke DTX-ELT**.

L'appareil envoie des signaux électriques à travers chaque fil du câble et mesure plusieurs paramètres :

- **Wire Map** : vérifie que chaque fil est bien connecté aux bonnes broches des deux côtés (conformément à la norme T568B)
- **Continuité** : détecte les coupures, courts-circuits ou inversions de fils
- **NEXT** (Near-End CrossTalk) : mesure les interférences entre les paires de fils
- **Insertion Loss** : mesure l'atténuation du signal sur la longueur du câble
- **Delay Skew** : vérifie que les signaux arrivent bien en même temps sur toutes les paires

À la fin du test, l'appareil affiche **PASS** si tout est conforme aux normes (ici TIA Cat 6), ou **FAIL** si un ou plusieurs paramètres sont hors tolérance.

Test Fluke dans un milieu hospitalier

Dans notre cas, le test a été effectué sur le câble **SR 04 3**, un câble Cat 6A U/UTP présent dans l'infrastructure réseau de l'établissement.

Lors du test, le Wire Map affiche immédiatement un résultat **FAIL**. En analysant les résultats, on constate que la **paire 7-8 est en circuit ouvert (Open)**, ce qui signifie qu'il n'y a aucune continuité électrique entre les deux extrémités du câble sur cette paire. Concrètement, un ou plusieurs fils sont coupés à l'intérieur du câble.

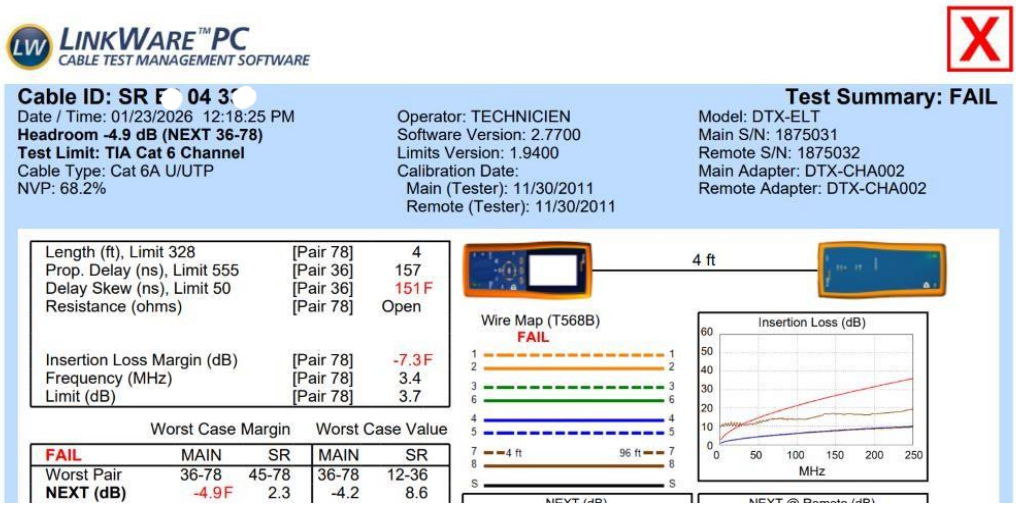

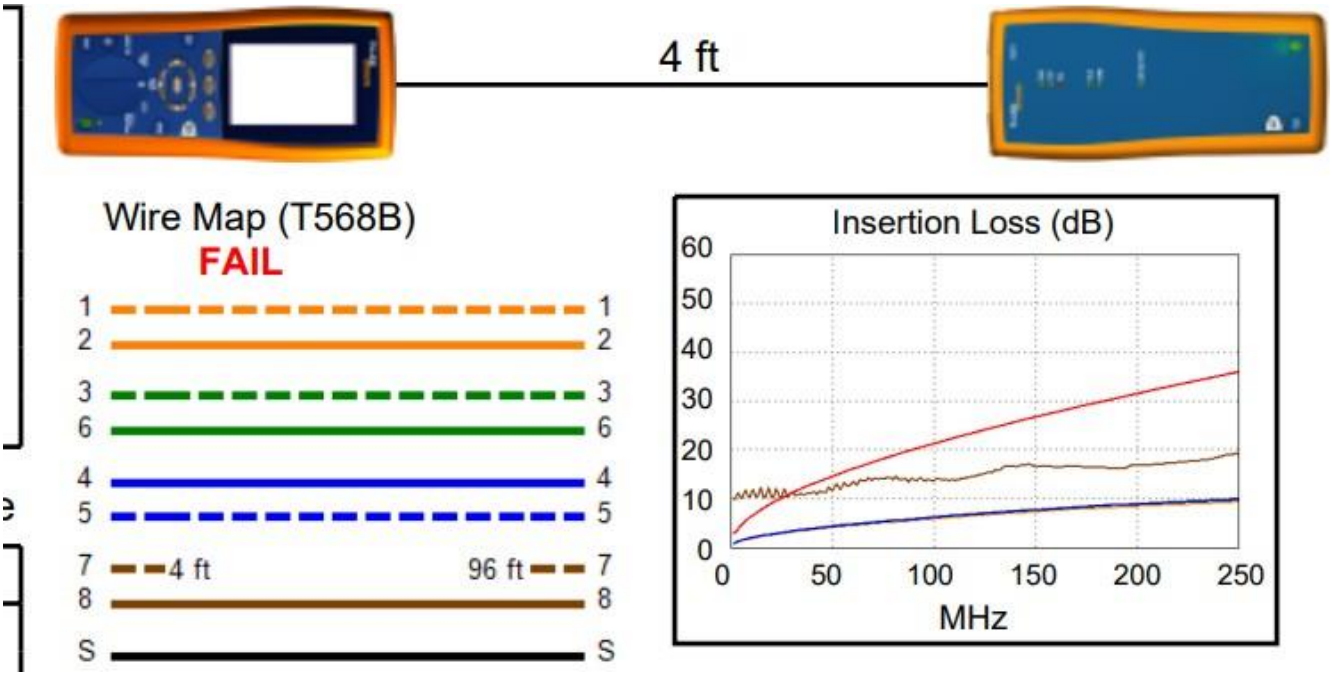

Ce défaut confirme que le câble est défectueux, ce qui empêche la transmission correcte du signal, indépendamment de l'état de la prise réseau.
